

เอกสารประกอบการประชุม

ปฐมนิเทศโครงการ

งานจ้างสำรวจ ออกแบบ

โครงการระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพล

ไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก



เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ผันน้ำ สู่พื้นที่เกษตร
สร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน



เพิ่มความมั่นคง
ด้านน้ำ



ส่งเสริม
ภาคการเกษตร



ยกระดับ
คุณภาพชีวิต



กิจการร่วมค้า FAZ JV



บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแทนท์ส จำกัด



บริษัท เอวารินทร์
วิศวกรรม จำกัด



บริษัท ซีนิส พลัส
เทคโนโลยี จำกัด



ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการ



www.โครงการผันน้ำเขื่อนภูมิพลไปยังคลองแม่ระกา.com



02-968-4461-2




Fax : 02-968-4464

กิจการร่วมค้า FAZ JV

45 ซอยประชาราษฎร์ 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ปัญหาและความเป็นมาโครงการ

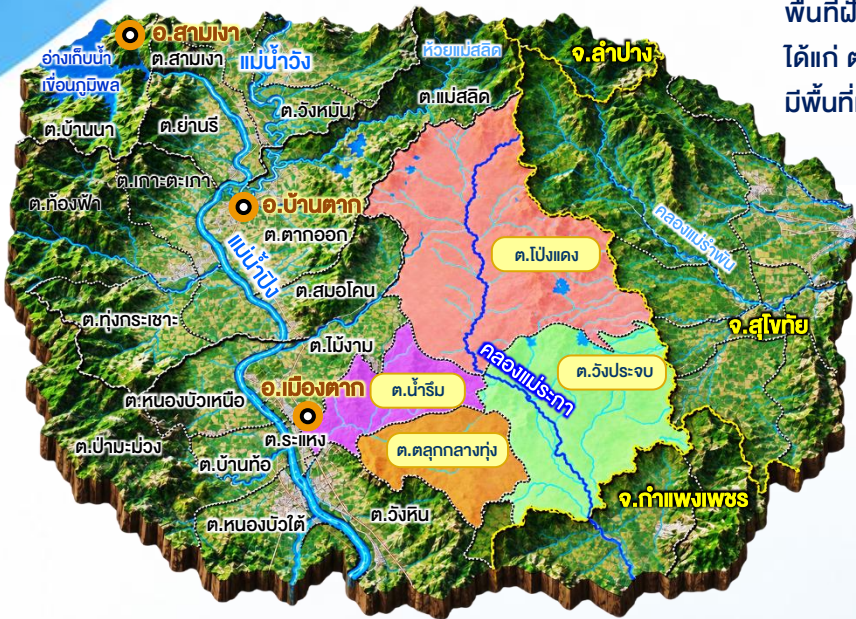

พื้นที่ฝั่งตะวันออกของอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ครอบคลุม 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลโป่งแดง ตำบลน้ำร้อน ตำบลวังประจบ และตำบลตลุกกลางทุ่ง มีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ **226,711 ไร่**



ปัจจุบัน พื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทาน เพียง **19,815 ไร่** หรือประมาณร้อยละ 8.7 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด



พื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดด้านแหล่งน้ำต้นทุนและแหล่งเก็บกักน้ำ ส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ตลอดทั้งปี และกระทบต่อการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชน



จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อขยายพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงน้ำได้ และเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้กับพื้นที่ ทั้งด้านการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชน



แนวทางการแก้ไขปัญห

กรมชลประทาน ดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบผันน้ำจากแม่น้ำปิงไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก

1



ศึกษาความเหมาะสม

- ศึกษาปัญหา ทางเลือก และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม
- ผลการศึกษาแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564

2



เข้าสู่การสำรวจ ออกแบบรายละเอียด

- ทบทวนข้อมูลสำรวจภาคสนาม และออกแบบรายละเอียด
- พัฒนารายละเอียดด้านวิศวกรรมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง
- เริ่มดำเนินการ 6 มิถุนายน 2569
- แล้วเสร็จ 25 พฤษภาคม 2571



วัตถุประสงค์ของโครงการ

1



สร้างความมั่นคงด้านน้ำ

จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนจากเขื่อนภูมิพล เพื่อเสริมการใช้น้ำของคลองแม่ระกา ให้เพียงพอและมั่นคงตลอดปี

2



เพิ่มประสิทธิภาพภาคเกษตร

เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์สำหรับพื้นที่การเกษตร ลดความเสี่ยงจากภัยแล้งและเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร

3



ยกระดับคุณภาพชีวิต

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีน้ำอุปโภค-บริโภคเพียงพอ และส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของพื้นที่อย่างยั่งยืน

เส้นทางการผันน้ำ (Water Diversion Route)



แม่น้ำปิง
(เขื่อนภูมิพล)



สถานีสูบน้ำหลัก
เหนือเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง



ท่อผันน้ำ
(แนวผันน้ำหลัก)
บริเวณพื้นที่ อ.สามเงา
และ อ.แม่สลิ



แหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน
อ่างเก็บน้ำต่าง ๆ



ระบบกระจายน้ำ
พื้นที่รับประโยชน์หลักและ
พื้นที่รับประโยชน์ตามแนวท่อ

การดำเนินงานสำรวจและออกแบบรายละเอียด

01

งานทบทวนข้อมูลโครงการ

- ทบทวนลักษณะทางอุทกวิทยาของโครงการ
- ทบทวนข้อมูลงานสำรวจภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ปฐพีกลศาสตร์ฐานรากและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
- ทบทวนลักษณะความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม
- ทบทวนลักษณะความเหมาะสมของโครงการ



02

งานสำรวจ

- สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
- สำรวจและทดสอบธรณีวิทยา ปฐพีกลศาสตร์ และแหล่งวัสดุก่อสร้าง



03

งานออกแบบเบื้องต้น

- จัดทำแนวคิดในการออกแบบ
- จัดทำเกณฑ์กำหนดในการออกแบบ
- งานออกแบบร่างทั่วไป (General Layout)



04

งานออกแบบรายละเอียดและประมาณราคา

- งานออกแบบและจัดทำแบบรายละเอียด
- งานออกแบบและจัดทำแบบแปลนต้นฉบับกระดาษ
- งานจัดทำรายการคำนวณหาปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง (Bill of Quantity)
- งานจัดทำรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Technical Specification)



05

ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

- การประชุมปฐมนิเทศโครงการ
- ชี้แจงข้อมูลโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการ จำนวน 2 ครั้ง
- การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
- กิจกรรมตรวจติดตามโครงการ จำนวน 2 ครั้ง
- สัมมนาแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการออกแบบ
- สัมมนาสรุปโครงการขึ้นออกแบบรายละเอียด



ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ



วันเริ่มสัญญา

6

มิถุนายน 2569

ระยะเวลา

720


วัน



วันสิ้นสุดสัญญา

25

พฤษภาคม 2571

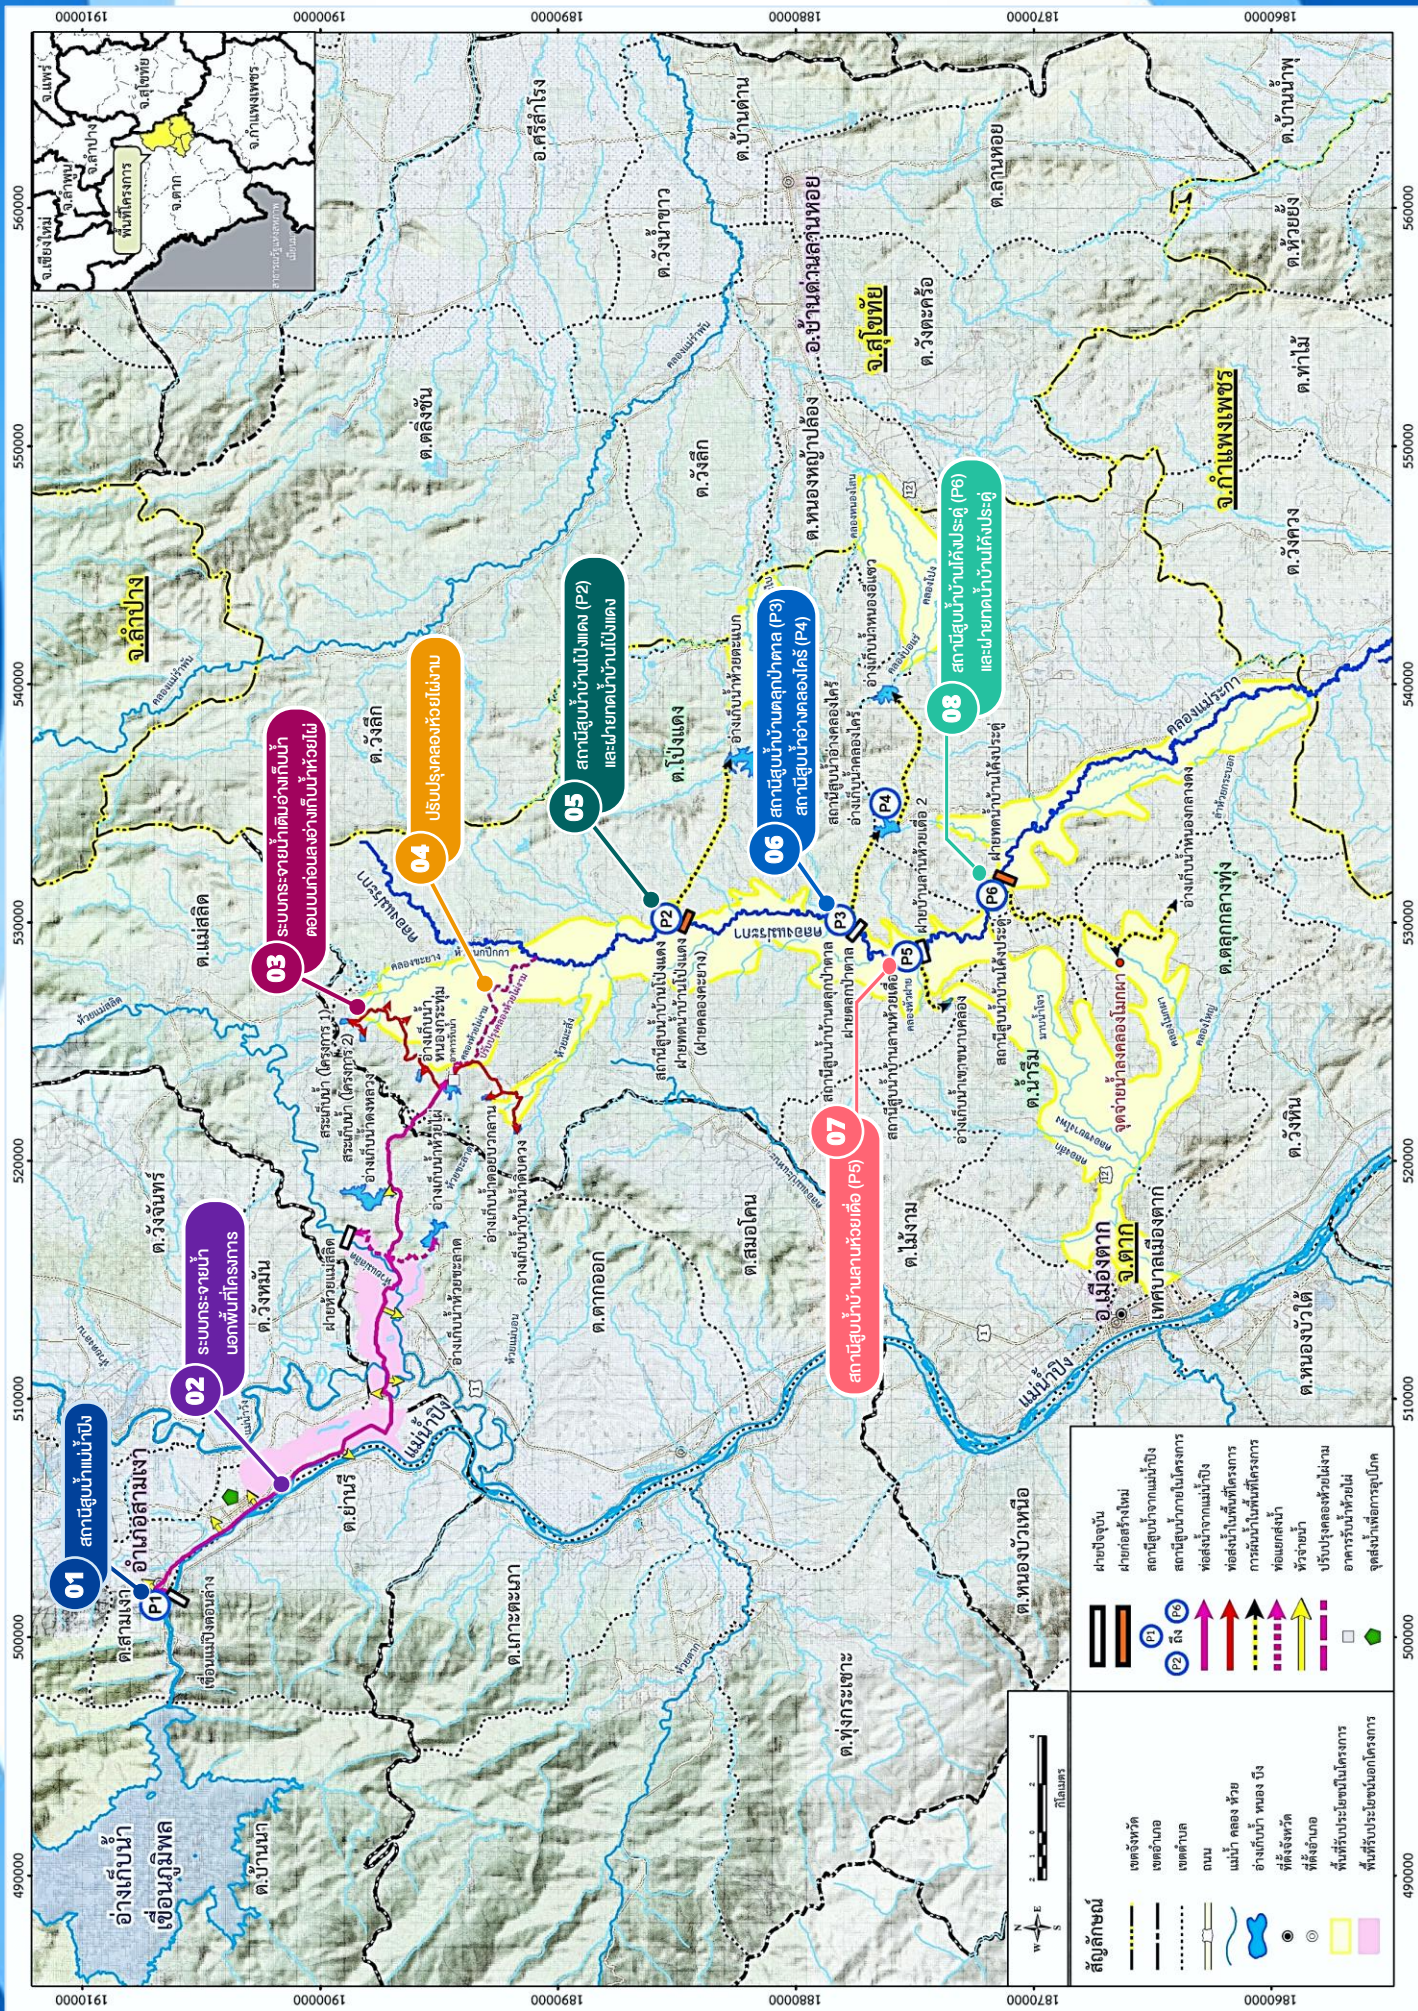

องค์ประกอบโครงการ

01 สถานีสูบน้ำหลัก P1 สถานีสูบน้ำแม่ปั๊งบึง

- เครื่องสูบน้ำ อัตราการสูบน้ำรวม
- เครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 ลบ.ม./วินาที
- ระดับน้ำปกติ 8 เครื่อง (สำหรับ 1 เครื่อง)
- ระดับน้ำสูงสุด +138.000 ม.(ร.ท.ก.)
- ระดับน้ำสูงสุด +140.000 ม.(ร.ท.ก.)

02 ระบบกระจายน้ำ นอกพื้นที่โครงการ

- ระบบท่อส่งน้ำจากแม่ปั๊บบึงไปยังพื้นที่น้ำห้วยไผ่ พร้อมอาคารประกอบ
 - ท่อส่งน้ำขนาด Ø 1.80 เมตร (31.09 กิโลเมตร)
 - อาคารประกอบ 4 แห่ง หัวจ่ายน้ำ 10 แห่ง
- ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบเพื่อไปเติมน้ำเข้าห้วยแม่สลิด
 - ท่อส่งน้ำขนาด Ø 0.50 เมตร (2.60 กิโลเมตร)
- ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบเพื่อไปเติมน้ำเข้าห้วยละดาด
 - ท่อส่งน้ำขนาด Ø 0.30 เมตร (2.70 กิโลเมตร)
- ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบเพื่อไปเติมน้ำเข้าห้วยหลวง
 - ท่อส่งน้ำขนาด Ø 0.30 เมตร (0.40 กิโลเมตร)

03 ระบบกระจายน้ำ เติมน้ำเข้าคลองแม่บ่อนก่อนลงอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่

- ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบเพื่อไปเติมน้ำเข้าห้วยไผ่และอื่น ๆ
 - ช่วงที่ 1 ท่อส่งน้ำขนาด Ø 0.50 เมตร (1.30 กิโลเมตร)
 - ช่วงที่ 2 ท่อส่งน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร (5.20 กิโลเมตร)
- ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบเพื่อไปเติมน้ำเข้าห้วยหลวงและอ่างเก็บน้ำบ้านดิบดอง
 - ช่วงที่ 1 ท่อส่งน้ำขนาด Ø 0.50 เมตร (4.20 กิโลเมตร)
 - ช่วงที่ 2 ท่อส่งน้ำขนาด Ø 0.30 เมตร (2.00 กิโลเมตร)

04 งานปรับปรุงคลอง คลองห้วยไผ่งาม

งานปรับปรุงคลองห้วยไผ่งาม

8.80 กิโลเมตร

05

จุดผิมน้ำคลองแม่ประกา
บ้านบึงแดงไปอ่างเก็บน้ำห้วยตะแบก

- P2 สถานีสูบน้ำบ้านบึงแดง
ท่อส่งน้ำไปอ่างเก็บน้ำห้วยตะแบก ความยาว
ฝ่ายกตน้ำบ้านบึงแดง 1 แห่ง (ก่อสร้างใหม่)

1 แห่ง
6.96 กิโลเมตร
1 แห่ง (ก่อสร้างใหม่)

06

จุดผิมน้ำคลองแม่ประกา
บ้านตลุกป่าตาลไปอ่างเก็บน้ำคลองโครี
และอ่างเก็บน้ำหนองอีแซว

- P3 สถานีสูบน้ำบ้านตลุกป่าตาล
ท่อส่งน้ำไปอ่างเก็บน้ำคลองโครี ความยาว 1 แห่ง
4.27 กิโลเมตร
- P4 สถานีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโครี
ท่อส่งน้ำไปอ่างเก็บน้ำหนองอีแซว ความยาว 1 แห่ง
6.06 กิโลเมตร

07

จุดผิมน้ำคลองแม่ประกา
บ้านลานห้วยไผ่ไปอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง


- P5 สถานีสูบน้ำบ้านลานห้วยไผ่
ท่อส่งน้ำไปอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง ความยาว 1 แห่ง
2.89 กิโลเมตร

08

จุดผิมน้ำคลองแม่ประกา
บ้านโค้งประดู่ไปอ่างเก็บน้ำหนองกลางดง

- P6 สถานีสูบน้ำบ้านโค้งประดู่
ท่อส่งน้ำไปอ่างเก็บน้ำหนองกลางดง ความยาว 1 แห่ง
11.41 กิโลเมตร
- ฝ่ายกตน้ำบ้านโค้งประดู่ 1 แห่ง (ก่อสร้างใหม่)
- สะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองแม่ประกา 1 แห่ง
- จุดจ่ายน้ำคลองโมกฉา 1 แห่ง

พื้นที่รับประโยชน์โครงการ

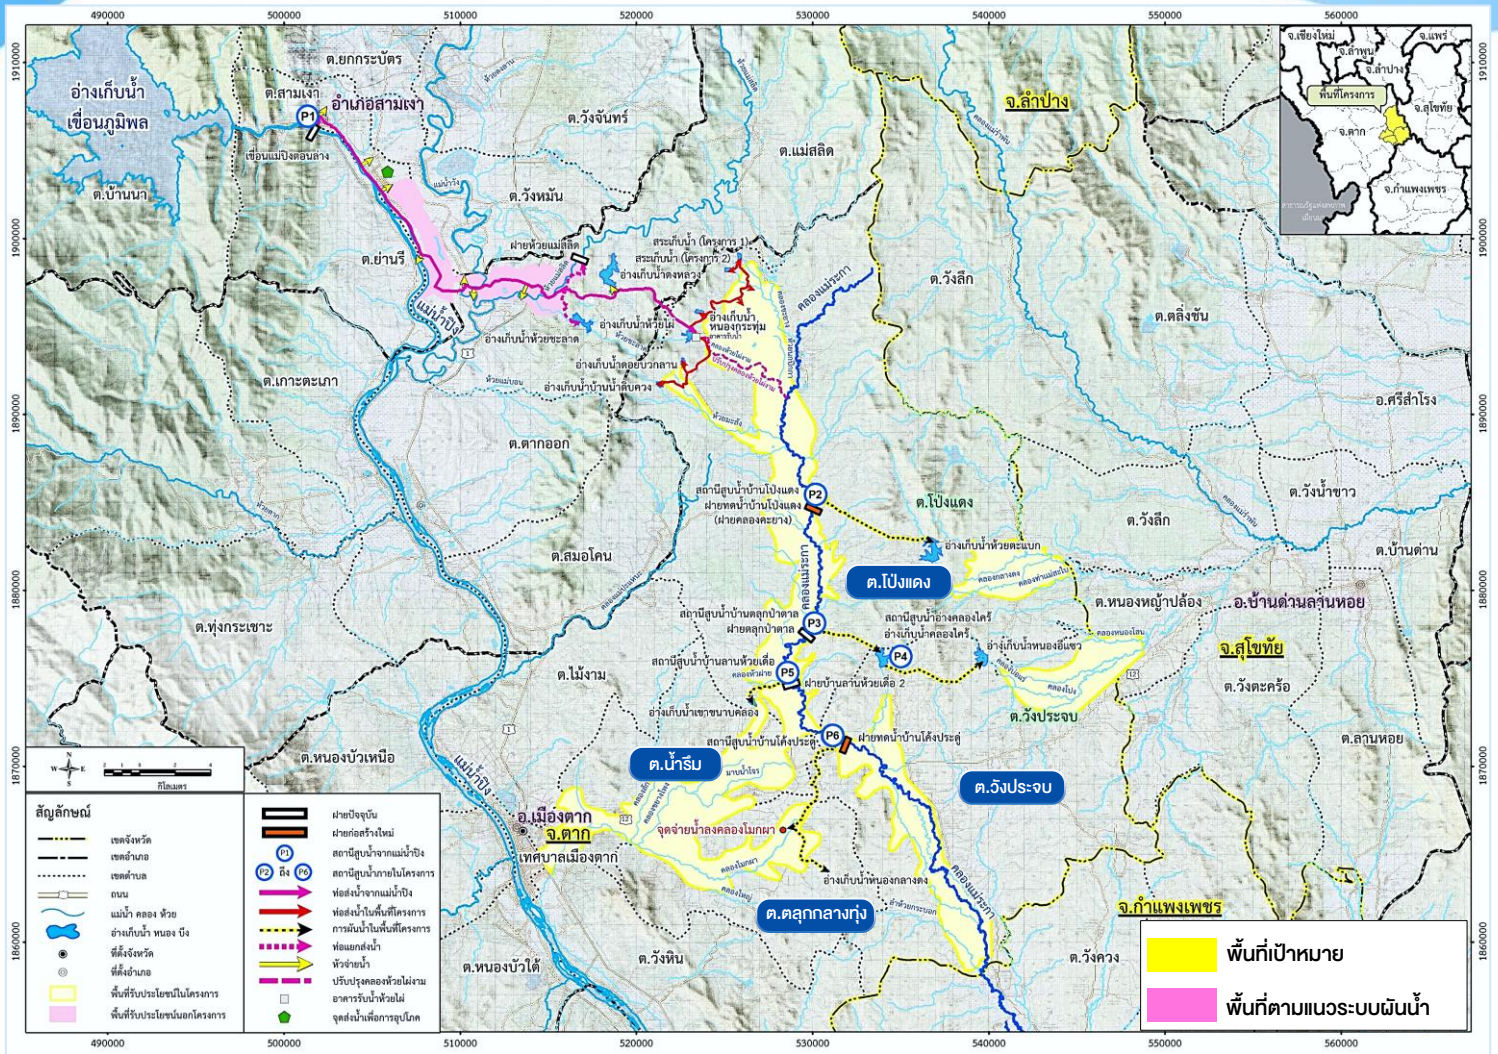

1

พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่รวม **50,000** ไร่



ต.โป่งแดง

20,360 ไร่



ต.วังประจบ

15,439 ไร่



ต.น้ำร้อน

8,479 ไร่



ต.ตลุกกลางทุ่ง

5,722 ไร่

2

พื้นที่ตามแนวระบบผันน้ำ

(แนวท่อผันน้ำ)

พื้นที่รวม **5,000** ไร่



ต.สามเงา อ.สามเงา

2,000 ไร่



ต.แม่สลิค อ.บ้านตาก

3,000 ไร่

แผนการปฏิบัติงานโครงการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 720 วัน



เริ่มสัญญา
6 มิถุนายน 2569

1



มิ.ย. - ก.ย. 69

งานศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาโครงการที่ผ่านมาเพื่อทำความเข้าใจบริบทและข้อมูลเบื้องต้นของโครงการพร้อมทั้งทบทวนลักษณะและรูปแบบองค์ประกอบโครงการ



2



มิ.ย. - ก.ย. 69

งานจัดทำแนวคิดและเกณฑ์กำหนดในการออกแบบ

จัดทำแนวคิดเบื้องต้นของการออกแบบโครงการและกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมที่จะใช้ในการคำนวณและออกแบบโครงสร้างและระบบต่าง ๆ



3



ก.ย. 69 - ก.ค. 70

งานสำรวจ

- สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทำแผนที่
- งานสำรวจธรณีวิทยา ภูมิพิทศาสตร์และแหล่งวัสดุก่อสร้าง



4



ต.ค. 69 - มี.ค. 70

งานออกแบบร่างทั่วไป

เริ่มต้นออกแบบโครงการ โดยนำข้อมูลสำรวจมาวาง Layout รูปแบบองค์ประกอบโครงการคร่าว ๆ



5



ม.ค. 70 - เม.ย. 71

งานออกแบบรายละเอียด

- งานออกแบบและจัดทำแบบต้นร่างรายละเอียด
- งานออกแบบและจัดทำแบบต้นรายละเอียดไต่จนจบ
- งานจัดทำรายการคำนวณเพื่อการออกแบบ
- รายงานการคำนวณหาปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง
- รายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม



6



ส.ค. 70 - พ.ค. 71

งานจัดทำรายงานคู่มือต่าง ๆ

- งานจัดทำรายงานคู่มือการบริหารจัดการน้ำ
- รายงานคู่มือการบริหารจัดการงานก่อสร้าง



7



ม.ค. - พ.ค. 71

งานจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

- จัดทำรายงานสรุปโครงการขั้นตอนออกแบบรายละเอียด
- รายงานปิดโครงการ



สิ้นสุดสัญญา
25 พฤษภาคม 2571

แผนการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

24 ก.ย. 69



จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ

เพื่อนำเสนอรายละเอียดและแผนการดำเนินงานโครงการให้กับหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

ก.ย. - ต.ค. 69



งานจัดสัมมนาแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการออกแบบโครงการ

เพื่อถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรกรมชลประทาน โดยเน้นการถ่ายทอดข้อมูลโครงการ ขั้นตอน วิธีการกำหนด รวมถึงแนวคิดและเกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบ และนำความคิดเห็นและคำแนะนำมาปรับใช้ให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด

ต.ค. - พ.ย. 69



กิจกรรมชี้แจงให้ข้อมูลโครงการกับประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 1

เพื่อชี้แจงข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานสำรวจ ออกแบบโครงการ ให้กับประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการรับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพื้นที่

ม.ค. - ก.พ. 70



กิจกรรมตรวจติดตามโครงการ ครั้งที่ 1

กิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชน ในช่วงเริ่มต้นโครงการ เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องสู่ประชาชน ในด้านขั้นตอนสำรวจ ออกแบบ รวมถึงด้านการพัฒนาโครงการและบริหารจัดการน้ำ

ก.ย. - ต.ค. 70



กิจกรรมตรวจติดตามโครงการ ครั้งที่ 2

กิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชน ในช่วงออกแบบรายละเอียดโครงการ เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องสู่ประชาชน ด้านการออกแบบรายละเอียด องค์ประกอบโครงการ รวมถึงด้านการพัฒนาโครงการและบริหารจัดการน้ำ

ม.ค. - ก.พ. 71



กิจกรรมชี้แจงข้อมูลโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 2

เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการสำรวจ ออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการ ให้กับประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการรับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพื้นที่

ม.ค. - ก.พ. 71



งานจัดสัมมนาสรุปโครงการขึ้นออกแบบรายละเอียด

เพื่อถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรกรมชลประทาน โดยจะนำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงาน ขั้นตอนและวิธีการสำรวจ การคำนวณทางวิศวกรรม ตลอดจนการจัดทำแบบรายละเอียดและเอกสารประกอบต่าง ๆ

ก.พ. - มี.ค. 71



จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ

เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำรวจ ออกแบบ ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และนำไปปรับปรุงพัฒนาโครงการให้เหมาะสมในขั้นสุดท้าย

การดำเนินงานที่ผ่านมา

งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน



วันที่ 1-2 กันยายน 2569

เข้าพบผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล

วันที่ 1 ก.ย. 69 | ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ผู้แทนกรมชลประทาน และคณะทำงานกิจการร่วมค้า FAZ JV ลงพื้นที่เข้าพบผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล และรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการ องค์ประกอบโครงการ ขั้นตอนและแผนการดำเนินงานสำรวจ ออกแบบ งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของโครงการต่อไป



นายประสิทธิ์ อุปชิต

ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล



1 ก.ย. 2569



1 ก.ย. 2569



1 ก.ย. 2569



1 ก.ย. 2569



1 ก.ย. 2569



1 ก.ย. 2569

เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

วันที่ 2 ก.ย. 69 | ณ ศาลากลางจังหวัดตาก



2 ก.ย. 2569



2 ก.ย. 2569



2 ก.ย. 2569



2 ก.ย. 2569



2 ก.ย. 2569



2 ก.ย. 2569



2 ก.ย. 2569



2 ก.ย. 2569



2 ก.ย. 2569

การดำเนินงานที่ผ่านมา

งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลงพื้นที่ เข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 หน่วยงาน

การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเปิดเวทีมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่โครงการ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียด องค์ประกอบ โครงสร้าง และแผนงานสำรวจ-ออกแบบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง สะท้อนข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่อย่างตรงไปตรงมา เพื่อนำข้อมูลอันมีค่าเหล่านี้ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพื้นที่ชุมชนอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด



1 ก.ย. 2569

นายณัฐพล คลัง
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
โครงการชลประทานตาก




1 ก.ย. 2569

นายณัฐพล รอดสัง
ปลัดอำเภอเมืองตาก
อำเภอเมืองตาก



2 ก.ย. 2569

นายวรรณณิ ดาเอนกริก
นายอำเภอบ้านตาก
อำเภอเมืองตาก



2 ก.ย. 2569

นางอรชดา สุขคำวงษ์
ฝ่ายกองช่าง อบต.แม่สลิ



3 ก.ย. 2569

นายทักษพร จอรรณ
รองนายก อบต.โป่งแดง



3 ก.ย. 2569

นายพิชญ อ่วมทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
อบต.น้ำริน




3 ก.ย. 2569

นายณัฐพล คลัง
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
อบต.ตลุกกลางทุ่ง



3 ก.ย. 2569

นายจิตรกร นาแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
อบต.วังประจบ



4 ก.ย. 2569

นายวิษณุ เพ็ชรโต
ปลัดอำเภอสามเงา
อำเภอสามเงา



4 ก.ย. 2569

นายอริรัตน์ เฟื่องจร
ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

1. เป็นโครงการที่ดี เนื่องจากบริเวณโซนตะวันออกคลองแม่ระกาจะมีปัญหากัญแล้งและมีการปลูกพืชที่ใช้น้ำค่อนข้างมาก ทางพื้นที่ชุมชนยินดีให้ความร่วมมือ
2. อยากให้ศึกษาจุดกักเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน โดยเข้ามาปรึกษากับทางท้องถิ่นได้ บางพื้นที่มีโครงการที่จะขุดอ่างเก็บน้ำเอาไว้เก็บน้ำในอนาคตจะได้เป็นการทำงานกับซ้อนกัน
3. ยินดีอย่างยิ่งกับโครงการนี้ ประชาชนในพื้นที่จะได้มีน้ำใช้ เพราะปกติหน้าแล้งในฝั่งคลองแม่ระกาไม่มีน้ำเลย อยากให้โครงการก่อสร้างโดยเร็วเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
4. ตำบลวังประจบขาดแคลนน้ำอย่างมาก มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค น้ำบาดาลก็ไม่มีน้ำ หากมีน้ำจากคลองแม่ระกา จะเกิดประโยชน์อย่างมากซึ่งต้องการให้เกิดขึ้นโดยเร็วและมีการผลักดันอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานที่ผ่านมา

สำรวจพื้นที่โครงการ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 ผู้แทนกรมชลประทาน นายศรายุทธ เก่งการท่า หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย คณะทำงาน
กิจการร่วมค้า FAZ JV ลงสำรวจพื้นที่โครงการเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการออกแบบและวางแผนการดำเนินในขั้นต่อไป

สถานีสูบน้ำหลัก P1 บริเวณเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง



ตำแหน่งที่ตั้งสถานีสูบน้ำหลัก P1



ตำแหน่งที่ตั้งสถานีสูบน้ำหลัก P1



ตำแหน่งที่ตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย



เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง
อ.สามเงา จ.ตาก

อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ บ้านหนองนกปีกกา ต.โป่งแดง



อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่



บริเวณถนนเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่



บริเวณก่อสร้างคลองห้วยไผ่



ก่อสร้างคลองห้วยไผ่

สถานีสูบน้ำบ้านตลกป่าตาล P3 ต.โป่งแดง



สภาพบริเวณที่ตั้งสถานีสูบน้ำ P3



ฝายตลกป่าตาล



ชาวบ้านในพื้นที่ฝายตลกป่าตาล



สภาพฝายตลกป่าตาล

สถานีสูบน้ำบ้านลานห้วยเตือ P5 ต.โป่งแดง



สภาพบริเวณที่ตั้งสถานีสูบน้ำ P5



ฝายบ้านลานห้วยเตือ



สภาพคลองแม่ระภาบริเวณฝาย



สำรวจบริเวณพื้นที่ฝาย



งานจ้างสำรวจ ออกแบบ
โครงการระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพล
ไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก

กิจการร่วมค้า FAZ JV

45 ซอยประชาราษฎร์ 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000



02-968-4461-2



Fax : 02-968-4464
